



INFORME DE EMPALME – SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

Periodo 15 de julio de 2025 a 10 de diciembre de 2025

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, *“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”*, y en el marco del proceso de empalme institucional, se presenta el informe de entrega de la Subdirección de Contratos y Seguimiento del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de julio de 2025 y el 10 de diciembre de 2025.

La gestión que se reporta en el presente documento fue adelantada por el servidor público JUAN PABLO ALZATE SOTO, nombrado mediante la Resolución No. 202513000000915 de 11 de julio de 2025 y posesionado según Acta No. 15 del 15 de julio de 2025, en cumplimiento de las funciones asignadas al empleo de Libre Nombramiento y Remoción denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 20 de la Subdirección de Contratos y Seguimiento del IPSE, de conformidad con la normativa vigente y la estructura organizacional de la Entidad.

El informe tiene como propósito presentar el estado actual de los procesos, proyectos, recursos, herramientas de gestión y demás asuntos a cargo de la Subdirección, con el fin de garantizar la continuidad de la gestión administrativa y misional, suministrando información organizada, verificable y soportada que facilite la toma de decisiones por parte de la administración entrante.

La Subdirección de Contratos y Seguimiento es la dependencia encargada de liderar y apoyar la gestión contractual de la entidad en lo relativo a proyectos de implementación, realizar el seguimiento a proyectos e infraestructura energética en las Zonas No Interconectadas, velar por el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad del sector, apoyar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía, acompañando a los operadores y esquemas

empresariales, contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad de las soluciones energéticas promovidas por el Instituto.

El presente documento consolida los avances alcanzados durante el periodo reportado, el estado de los proyectos en sus diferentes fases, los riesgos identificados y los asuntos estratégicos que requieren continuidad, constituyéndose en un insumo para el adecuado desarrollo de la gestión institucional bajo los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia, coordinación y continuidad del servicio público.

2. NOMBRAMIENTO

A través de nombramiento ordinario según la Resolución No. 202513000000915 de 11 de julio de 2025 y posesionado según Acta No. 15 del 15 de julio de 2025, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción denominado Subdirector Técnico, Código 0150 Grado 20, asumí la Subdirección de Contratos y Seguimiento del Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas – IPSE, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL IPSE



GRUPOS DE LA SUBDIRECCIÓN





3.1 Conformación equipo de trabajo (Personal de planta)

Grupo Interno de Trabajo	Personas - Cargo
Grupo de Seguimiento y Supervisión	• Sergio Silva Ariza – Coordinador • Jairo Alberto Valencia – Asesor • Germán Hernández – Profesional Especializado • Munir Alberto Montedeoca – Profesional Especializado
Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio	• Camilo Andrés Triana – Coordinador • Lina María Méndez – Profesional Especializado • Pedro Orlando Castro – Profesional Especializado • Jose Antonio Murillo – Profesional Especializado • Edgar Danilo Obando – Profesional Especializado • Álvaro Alexander Mossos – Profesional Especializado (CNM) • Santiago Andrés Llanos - Profesional Especializado (CNM) • Oscar Alexander Arbeláez – Profesional Especializado (CNM) • Jhon Eduar Valencia – Técnico Administrativo (CNM)

4. ESTADO DE CONTRATOS / CONVENIOS

CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Nº.	Nº. CONTRATO	ADMINISTRADOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO CONTRATO	ESTADO	SUPERVISOR	RESPONSABLE	TECNICO	CIVIL	FINANCIERO	AMBIENTAL	SOCIAL	SGSST	JURIDICO
1	087-2012	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS			CONVENIO	EN LIQUIDACION JUDICIAL	MUNIR MONTEDEOCA	JOSE LEONARDO CABEZAS	NO	NO	CAROLINA HURTADO	NO	NO	NO	MARIA JOSE AGUILAR
2	080-2013	DPS - ENTERRITORIO			CONVENIO	EN LIQUIDACION JUDICIAL	MUNIR MONTEDEOCA	JOSE LEONARDO CABEZAS	NO	NO	CAROLINA HURTADO	NO	NO	NO	MARIA JOSE AGUILAR

CONTRATOS EN LIQUIDACIÓN

Nº.	Nº. CONTRATO	ADMINISTRADOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO CONTRATO	ESTADO	SUPERVISOR	RESPONSABLE	TECNICO	CIVIL	FINANCIERO	AMBIENTAL	SOCIAL	SGSST	JURIDICO
3	122-2020	GOBERNACION GUAJIRA	LA GUAJIRA		CONVENIO	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	JOSE LEONARDO CABEZAS	CARLOS LOPEZ	NO	CAROLINA HURTADO	NO	NO	NO	JULIAN ROJAS
4	124-2020	DISPAC	LA GUAJIRA	URIBIA	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	JOSE LEONARDO CABEZAS	CARLOS LOPEZ	NO	CAROLINA HURTADO	JAIME DANGOND	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
5	132-2021	DISPAC	GUAINIA	BARRANCOMINAS	CONVENIO	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	EDWIN RODRIGUEZ	NO	NO	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	ANDERSON FORERO
6	141-2021	EMELCE	GUAINIA	INIRIDA BARRANCOMINAS	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	STEFANY TORRES	NO	NO	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
7	142-2021	DISPAC	LA GUAJIRA - CESAR - COCHO		INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	FERNAN SEVERICH	NO	NO	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	ANDERSON FORERO
8	143-2021	ENERGUAVIARE	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	GERMAN HERNANDEZ	EDWIN RODRIGUEZ	NO	NO	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
9	159-2021	DISPAC	CAQUETA - AMAZONAS - NARIÑO		INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	JAIR VALENCIA	ADRIANA DIAZ	ADRIANA DIAZ	NO	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
10	112-2023	ENERGUAVIARE	LA GUAJIRA	URIBIA	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	JAIR VALENCIA	FELIPE TORRES	NO	NO	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
11	304-2023	CONSORCIO INTERGUAJIRA SUR	LA GUAJIRA	URIBIA	INTERVENTORIA CONTRATO OBRA 280-2023 - SUR	EN LIQUIDACION	GERMAN HERNANDEZ	ELKIN ORTIZ	ELKIN ORTIZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	JAIME DANGOND	LEIDY SILVA	LUBIRTON LANDAZURI	ANDERSON FORERO
12	307-2023	CONSORCIO ENERGIAS PELICANO	LA GUAJIRA	URIBIA	INTERVENTORIA CONTRATO 282-2023 - NORTE	EN LIQUIDACION	SERGIO SILVA ARIZA	ADRIANA DIAZ	ADRIANA DIAZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	LEIDY SILVA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
15	148-2024	TECHODIESEL SAS	CHOCÓ	ACANDI - CAPURGANA	SUMINISTRO	EN LIQUIDACION	JAIR VALENCIA	XIMENA ORDUZ	NO	NO	CAROLINA HURTADO	NO	NO	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
16	149-2024	JASEPCA ESP	CHOCÓ	ACANDI - CAPURGANA	TRANSPORTE	EN LIQUIDACION	JAIR VALENCIA	XIMENA ORDUZ	NO	NO	CAROLINA HURTADO	NO	NO	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
21	206-2024	GENSA	VALLE DEL CAUCA	BOLIVAR - DAGMA - FLORIDA - PRADERA	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	MUNIR MONTEDEOCA	BERNARDO TOBON	ELKIN ORTIZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
22	209-2024	GENSA	MAGDALENA - CESAR - ANTIOQUIA	PUEBLO VIEJO - PUÑO DEL CARMEN - ASTREA - MURINDO	INTERADMINISTRATIVO	EN LIQUIDACION	MUNIR MONTEDEOCA	BERNARDO TOBON	ELKIN ORTIZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Nº.	Nº. CONTRATO	ADMINISTRADOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO CONTRATO	ESTADO	SUPERVISOR	RESPONSABLE	TECNICO	CIVIL	FINANCIERO	AMBIENTAL	SOCIAL	SGSST	JURIDICO
13	306-2023	SECOB S.A.S.	BOLIVAR	CARTAGENA (ISLA GRANDE)	INTERVENTORIA CONTRATO OBRA 278-2023 - ISLA GRANDE	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	FERNAN SEVERICH	CARLOS LOPEZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
14	329-2023	ENERGUAVIARE	ATLANTICO	BARRANQUILLA - LITORAL DE SAN JUAN	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	GERMAN HERNANDEZ	CARLOS LOPEZ	CARLOS LOPEZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
17	155-2024	ENELAR	CHOCO	ACANDI - CAPURGANA	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	MUNIR MONTEDEOCA	ELKIN ORTIZ	ELKIN ORTIZ	BERNARDO TOBON	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
18	190-2024	ENELAR	VALUPES - CASANARE - VICHADA	CARURU - TARARA - SACAMA - SANTA ROSALIA	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	JAIR VALENCIA	ELKIN ORTIZ	ELKIN ORTIZ	JOSE DIAZ	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
19	199-2024	CEDELCA	CAUCA	ARGELIA - PATIA - PIENDEAMO - SOTARA	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	GERMAN HERNANDEZ	JOSE DIAZ	FELIPE TORRES	JOSE DIAZ	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
20	205-2024	ELECTROCAQUETA	LA GUAJIRA	ALBANIA	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	DAVID QUIÑONES	EDWIN RODRIGUEZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
23	212-2024	FENOGIE	LA GUAJIRA	URIBIA (NAZARETH)	CONVENIO	EJECUCION	GERMAN HERNANDEZ	XIMENA ORDUZ	NO	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
24	214-2024	DISPAC	CHOCO	ACANDI - CAPURGANA	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	STEFANY TORRES	CARLOS LOPEZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
25	215-2024	DISPAC	CHOCO - VICHADA - GUANIA	ALTO BAUDO - LA PRIMAVERA - INIRIDA - BARRANCOMINAS	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	JAIR VALENCIA	EDWIN RODRIGUEZ	EDWIN RODRIGUEZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
26	231-2024	Unión temporal INTERVENTORIAS GUAJIRA 2024	GUAJIRA	MANAURE	INTERVENTORIA CONTRATO OBRA 226-2024	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	CARLOS LOPEZ	CARLOS LOPEZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	JAIME DANGOND	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
27	262-2024	ENELAR	CHOCÓ	LITORAL DE SAN JUAN (BALSALITO - TIACIDILLO)	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	GERMAN HERNANDEZ	FELIPE TORRES	FELIPE TORRES	JOSE DIAZ	CAROLINA HURTADO	JAIME DANGOND	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
28	266-2024	CEDELCA	CAUCA	LOPEZ DE MICAY - GUAPI	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	JAIR VALENCIA	CARLOS LOPEZ	CARLOS LOPEZ	JOSE DIAZ	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
29	267-2024	DISPAC	CHOCO	NIQUI (GUACHALITO)	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	DAGO FONSECA	EDWIN RODRIGUEZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	LEIDY SILVA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
30	268-2024	ENELAR	CHOCÓ	LITORAL DE SAN JUAN (PAPAYO)	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	GERMAN HERNANDEZ	FELIPE TORRES	FELIPE TORRES	JOSE DIAZ	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR
31	269-2024	DISPAC	GUAVIARE - CHOCO	SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - ROSUCIO	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	MUNIR MONTEDEOCA	ADRIANA DIAZ	ADRIANA DIAZ	XIMENA ORDUZ	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	JULIAN ROJAS
32	170-2025	GENSA	CAUCA	JAMBALÓ - CORRITO - SILVIA - CALOTO	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	JAIR VALENCIA	XIMENA ORDUZ	ADRIANA DIAZ	BERNARDO TOBON	CAROLINA HURTADO	STEFANY TORRES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
33	178-2025	GENSA	GUAINIA - CHOCÓ - META - CASANARE - GUAVIARE	PUERTO COLOMBIA - ATRATO - CANTON DE SAN PABLO - URIBE - HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORE - MIRAFLORES	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	MUNIR MONTEDEOCA	BERNARDO TOBON	EDWIN RODRIGUEZ	BERNARDO TOBON	CAROLINA HURTADO	DAGO FONSECA	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	RAFAEL ARIZA
34	235-2025	ENELAR	CHOCÓ	UNGUA - ACANDI (CAPURGANA)	INTERADMINISTRATIVO	EJECUCION	SERGIO SILVA ARIZA	FERNAN SEVERICH	EDWIN RODRIGUEZ	FERNAN SEVERICH	CAROLINA HURTADO	DAVID QUIÑONES	YULY AVILA	LUBIRTON LANDAZURI	MARIA JOSE AGUILAR

1. Avance proyectos contratados en 2023 y antes

1. Avance proyectos contratados en 2023 y antes

N O	CONTRA TO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO	PERDIDA COMPETENCIA	AOM
1	141-2021	GUAINIA	INIRIDA , INIRIDA VENADO, SAN FELIPE, CHATARE BARRANCOMINAS, BARRANCOMINAS CARPINTERO	EN LIQUIDACIÓN (15/12/25)	07/2026	OK
2	143-2021	ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE, VAUPÉS	ARAUCA, ARAUQUITA, PUERTO RONDÓN, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MIRAFLORES, SAM JOSÉ DEL GUAVIARE, TARAIRA	EN LIQUIDACIÓN	09/2026	OK
3	144-2021	VICHADA	CUMARIBO, PUERTO CARREÑO, LA PRIMAVERA	LIQUIDADO	10/2026	OK
4	146-2021	ANTIOQUIA, BOLÍVAR, CASANARE, CÓRDOBA, MAGDALENA	DABEIBA, FRONTINO, ITUANGO , URRAO, MONTECRISTO Y RIO VIEJO, SANTA ROSA, TIQUISIO, CAÑO MOCHUELO (HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO), PAZ DE ARIPORO, SABANA LARGA, SAN JOSE DE URE, ARACATACA, TAMARA, TRINIDAD	LIQUIDADO	02/2027	OK
5	159-2021	NARIÑO, PUTUMAYO, AMAZONAS	IPIALES, PUERTO ASIS, ROSARIO, PUERTO LEGUIZAMO, SAN FRANCISCO, AMAZONAS	EN LIQUIDACIÓN	04/2027	OK
6	142-2021	CESAR, LA GUAJIRA, CHOCÓ	PAILITAS, ALBANIA, BARRANCAS, HATO NUEVO, MAICAO, MANAURE, RIOHACHA, VIILANUEVA, NUQUI - COQUI	EN LIQUIDACIÓN	06/2027	OK
7	132-2021	GUAINIA	BARRANCOMINAS	EN LIQUIDACIÓN	06/2027	OK
8	128-2022	CUNDINAMARCA, LA GUAJIRA	PAIME, URIBIA	LIQUIDADO	11/2025	OK
9	112-2023	GUAJIRA	URIBIA	EN LIQUIDACION	06/2026	PENDIENTE CABO DE LA VELA



1. Avance proyectos contratados en 2023 y antes

NO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO	PERDIDA COMPETENCIA	AOM
1	087-2012	BOGOTÁ	BOGOTÁ	PERDIDA DE COMPETENCIA	NA	NA
2	067-2013	BOGOTÁ	BOGOTÁ - CONSULTORIA	CIERRE DE EXPEDIENTE	NA	NA
3	080-2013	CHOCÓ	ARUSI	CIERRE DE EXPEDIENTE	NA	NA
4	124-2020	GUAJIRA	URIBIA - INTERCONEXIÓN FASE 2	EN LIQUIDACIÓN	04/2026	PENDIENTE ENTREGA FASE 2 CABO DE LA VELA

1. Estado de avance contratos 2023

NO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO	PERDIDA COMPETENCIA	AOM
7	279-2023	GUAJIRA	URIBIA -NORESTE	LIQUIDADO	04/2027	DISPOWER
8	280-2023	GUAJIRA	URIBIA- SUR	EN LIQUIDACION	04/2027	DISPOWER
9	281-2023	GUAJIRA	URIBIA CENTRO	LIQUIDADO	04/2027	DISPOWER
10	282-2023	GUAJIRA	URIBIA- NORTE	LIQUIDADO	04/2027	DISPOWER

Información General				
NO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO
1	278-2023	BOLÍVAR	ARCHIPIELAGO ISLAS DEL ROSARIO - ISLA GRANDE	EN EJECUCION
2	306-2023	BOLÍVAR	ARCHIPIELAGO ISLAS DEL ROSARIO - ISLA GRANDE	EN EJECUCION

Información Detallada		
No.	ACTIVIDADES	ISLA GRANDE
1	% Avance ejecutado:	95%
2	% Avance programado:	95%
3	Redes Baja tensión	100%
4	Redes media tensión	100%
5	Instalaciones eléctricas internas	392/392
6	Acometidas instaladas	392/392
7	Medidores instalados	302
8	Cajas de baja tensión	223/223
9	Cajas de media tensión	30/30
10	Cable instalado red MT	100%

No.	ACTIVIDADES	ISLETA
11	Cable instalado red BT	100%
12	Estructura paneles	100%
12.1	Pedestales	100%
12.2	Estructura instalada	100%
12.3	Paneles instalados	100%
13	Caseta	98%
13.3	Puertas	98%
13.4	Instalaciones eléctricas internas	98%
14	Cerramiento	100%
15	Instalaciones de transformadores	100%
16	Equipos en sitio	100%
17	Planta eléctrica	100%

En firma de acta de recibo y entrega con pendientes de ejecución
306-2023 En modificación contractual para prórroga hasta 2026 y su reserva



NO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO
1	329-2023	ATLÁNTICO, CHOCÓ	BARRANQUILLA - BARRIO LA PLAYA, BARRANQUILLA - BARRIO LAS MALVINAS, LITORAL DEL SAN JUAN.	EN EJECUCIÓN - 30/05/2026

ITEM	PROYECTO	% AVANCE	OBSERVACIONES
1.	Cancha Energética La Playa	96%	Culminadas 100% vigas aéreas Cerchas metálicas instaladas Cuarto de equipos en un 100% Diseño eléctrico de conexión a red aprobado por AIR-e, pendiente allegar los planos y memorias suscritos por el ingeniero diseñador de la SPE CONSTRUCCION DE CUBIERTAS 100% Pendiente conexión a la red y RETIE
2.	Cancha Energética Malvinas	96%	Culminadas 100% vigas aéreas Cerchas metálicas instaladas Cuarto de equipos en un 100% Diseño eléctrico de conexión a red aprobado por AIR-e, pendiente allegar los planos y memorias suscritos por el ingeniero diseñador de la SPE CONSTRUCCION DE CUBIERTAS 100% Pendiente conexión a la red y RETIE parcial instalación de media.
3.	Proyecto Piloto de poligeneración El Papayo	37%	En proceso de logística para obras civiles. La cual inicia en el mes de diciembre. Dificultades de acceso por orden público, replanteo realizado al 100% Pilotes al 90%. Pendiente diseños finales por SPE



2. Avance proyectos 2024 y 2025

2. Estado de avance contratos 2024

NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	REGISTRO fotográfico	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO TECNICO Y DE OBRA	% AVANCE CONTRATO
1	155-2024	ENELAR E.S.P.	13/12/2025	CHOCÓ	ACANDI - CAPURGANA		Se avanza en las tareas constructivas de la línea de subtransmisión de energía, se han hincado 171 postes, ya se retiraron 13 postes viejos. montaje de estructuras con novedades constructivas por esta supervisión, transformador elevador de 1mva en sitio y planta eléctrica en capurgana, falta traslado a la subestación (lluvias en la zona), se recibió replanteo y esta en revisión para adelantar trámite de modificación	CTO 40% AVANCE DE OBRA 10%
2	198-2024	ENELAR E.S.P.	31/12/2025	VAUPÉS VAUPÉS CASANARE VICHADA	CARURÚ TARAIRA SAMACA SANTA ROSALÍA	Usuarios en proceso de validación pendientes 15 usuarios en santa Rosalía	Se avanza en la ejecución de las instalaciones internas y cimentaciones para los paneles	CTO 40% AVANCE DE OBRA 10%
3	199-2024	CEDELCA S.A. E.S.P.	27/02/2026	CAUCA CAUCA CAUCA CAUCA	ARGELIA PATIA PIENDAMO - TUNIA SOTARA		Los proyectos de Piendamo, Sotara y Argelia se encuentran al 100% - El proyecto de patia se encuentra al 30% debido a problemas de orden público en la región.	70% AVANCE DE OBRA 70% Piendamo, Patia y Sotara 100 % Argelia 30%

2. Estado de avance contratos 2024

NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO DE USUARIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO TECNICO	% AVANCE CONTRATO
4	205-2024	ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.	31/12/2025 - Pendiente solicitud de prórroga (Se proyecta hasta 13/02/2026)	LA GUAJIRA	ALBANIA		Materiales en campo, gabinetes ensamblados con regulador e inversor, el medidor y batería se encuentran en bodega de Albania. Se tiene 293 soluciones energizadas con observaciones menores. Pendiente solicitud de reemplazo para usuarios que desistieron - 22	60% AVANCE DE OBRA 45,5%
5	214-2024	DISPAC S.A. E.S.P.	29/12/2025 - Pendiente radicar a contractual hasta 30/06/2026	CHOCÓ	ACANDI - CAPURGANA		Se dio inicio a las actividades de obra, adecuación de terreno e inicio de cimentación, así como se están realizando las compras de materiales y equipos importados. Primer pago a contratista derivado realizado.	48% AVANCE DE OBRA 10%

2. Estado de avance contratos 2024

NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO DE USUARIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO TECNICO	% AVANCE CONTRATO
6	215-2024	DISPAC S.A. E.S.P.	13/12/2025 – EN CONTRACTUAL HASTA EL 30/06/2026	CHOCO	ALTO BAUDO		Primavera: 67.61% avance de obra. Alto bauto: 90% avance de obra. El equipo está en campo haciendo verificación. Barrancominas 60.62% avance de obra. Inirida centraliado: 60.62% avance de obra. Inirida 2: 60.62% avance de obra (por verificar – reporte de interventoria)	Avance C.I. 64,49%
				VICHADA	LA PRIMAVERA			
				GUAINIA	INIRIDA			
				GUAINIA	INIRIDA			
				GUAINIA	INIRIDA			
				GUAINIA	BARRANCOMINAS			
7	226-2024	HG INGENIERIA	29/12/2025 – Pendiente solicitud de prórroga	GUAJIRA	MANAURE		Se avanza en las obras con un avance del 85%. Se tiene alrededor 160+ usuarios energizados. Se tiene recepción parcial. Se esta analizando un posible prórroga al contrato.	80% AVANCE DE OBRA 85%
8	262-2024	ENELAR	30/12/2025 – PENDIENTE SUBSANACIONES HASTA 30/06/2026	CHOCO	EL LITORAL DEL SAN JUAN – TIOCIDILIO Y UNIÓN BALSALITO	Replanteo en revisiones y ajustes.	Replanteo pendiente, radican el 3 dic Se inicio con el armado de estructura metálica, por temas de lluvia el avance a sido afectado. Se proyecta prórroga por nacionalización de importados y clima.	41% AVANCE DE OBRA 1.114%

2. Estado de avance contratos 2024

NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO DE USUARIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO TECNICO	% AVANCE CONTRATO
10	266-2024	CEDELCA	31/12/2025 - Pendiente tramite de prorroga con contractual (12-12-2025) Hasta 30/04/2025	CAUCA	LOPEZ DE MICAY	Replanteo aprobado	Instalaciones internas 100%, pendiente llegada de materiales importados mediados de enero.	60% AVANCE DE OBRA 50%
				CAUCA	GUAPI	Replanteo aprobado	Tramite de factibilidad de punto de conexión ante Cedenar pendiente. Se adelantó obra civil de adecuación de cubierta para paneles. En espera de equipos que arriban a mediados de enero.	
11	267-2024	DISPAC	30/12/2025	CHOCO	NUQUI - GUACHALITO	Replanteo autorizado 2-10-25. Valla autorizada. 	Actividades civiles para cimentaciones y encerramiento al 100% - Soportes para paneles metálico al 100% Cuarto de tecnologías solo civil al 100% - 25% suministro de paneles. Socializaciones al 70%	46,65% AVANCE DE OBRA 50%
12	268-2024	ENELAR	30/04/2026	CHOCO	LITORAL DEL SAN JUAN - PAPAYO	REPLANTEO AL 100%	Replanteo sin ajustes, aceptado. por temas de lluvia el avance a sido afectado.	42% AVANCE DE OBRA 0.74%



2. Estado de avance contratos 2024

NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO DE USUARIOS	AVANCE ETAPA DE REPLANTEO TECNICO	% AVANCE CONTRATO
14	269-2024	DISPAC	30/12/2025 – Pendiente radicar solicitud de prórroga hasta 30/06/2026	CHOCO	RIOSUCIO	En etapa de replanteo Riosucio 100%	Ya arribaron equipos importados. Se realizó primera pago por concepto de anticipo al contrato de interventoría.	45.2%
				GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	En etapa de replanteo Calamar 100%		AVANCE DE OBRA
				GUAVIARE	CALAMAR	Replanteo pendiente de planos de cimentación por parte de la SPE		

2. Estado de avance contratos 2025

	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	AVANCE	ESTADO
1	170-2025	CAUCA	CALOTO,SILVIA,TORIBIO,TOTORO,CORINTO Y JAMBALO. (6 Proyectos)	Cto INT 30% Obra 0%	EN EJECUCIÓN - 31/07/2026 Se esta realizando replanteo - Desembolsos 3/5 80% Se Avanza en actividades de compra
2	178-2025	GUAINIA,CHOCO,META,CA SANARE	PUERTO COLOMBIA, LA URIBE, HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO, MIRAFLORES, SOLANO, LOPEZ DE MICAY, MURINDO. (8 Proyectos)	Cto INT 10% Obra 0%	EN EJECUCIÓN - 31/12/2025 Se tiene actas de inicio de los proyectos iniciales, los cuales ya iniciaron socializaciones y replanteo. Para el proyecto de Solano y Lopez de micay estan en proceso de publicación de terminos de referencia.
3	235-2025	CHOCÓ, VAUPES	HUNGIA, ACANDÍ, MEDIO BAUDÓ, PACOA. (4 Proyectos)	Cto INT 0% Obra 0%	EN EJECUCIÓN - 31/12/2025 Se esta realizando avance para solicitud de prorroga 2026,
4	238-2025	CAQUETA	GUACAMAYAS-SAN VICNETE DEL CAGUAN	Cto INT 0% Obra 0%	EN EJECUCIÓN - 31/12/2025 Se esta realizando avances para prorroga al 2026.




2. Contratos en liquidación 2024


NO	CONTRATO	ADMINISTRADOR	FECHA DE FINALIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	ESTADO
5	208-2024	GENSA S.A. E.S.P.	29/08/2025	VALLE DEL CAUCA	BOLIVAR	EN LIQUIDACIÓN
				VALLE DEL CAUCA	DAGUA	
				VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	
				VALLE DEL CAUCA	PRADERA	
6	209-2024	GENSA S.A. E.S.P.	29/08/2025	ANTIOQUIA	MURINDO	EN LIQUIDACIÓN
				MAGDALENA	PUEBLO VIEJO	
				CESAR	ASTREA	
				MAGDALENA	PIJIÑO DEL CARMEN	

3. Informe de fiducias de contratos interadministrativos


3.1 Análisis de Saldos Mensuales

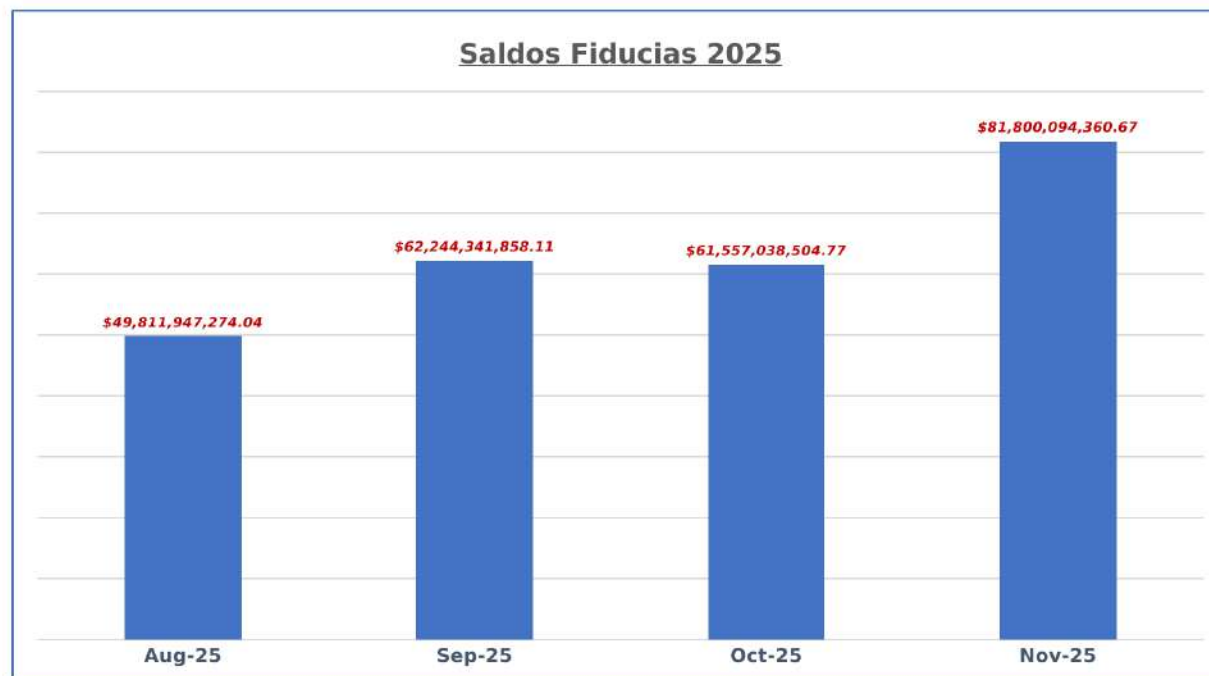


3.2 Saldos Fiducias por Contratista/Administrador

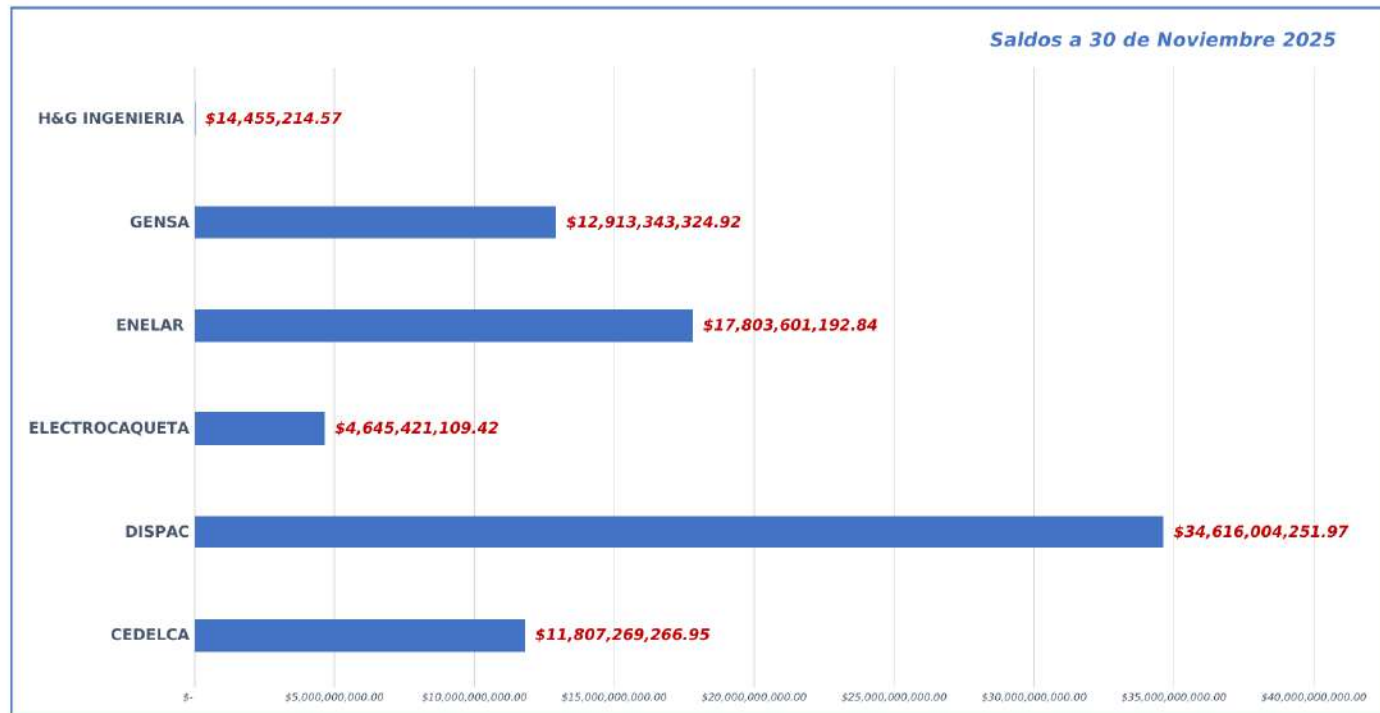

3.3 Saldos Fiducias por Contrato Vigencia 2024 y antes

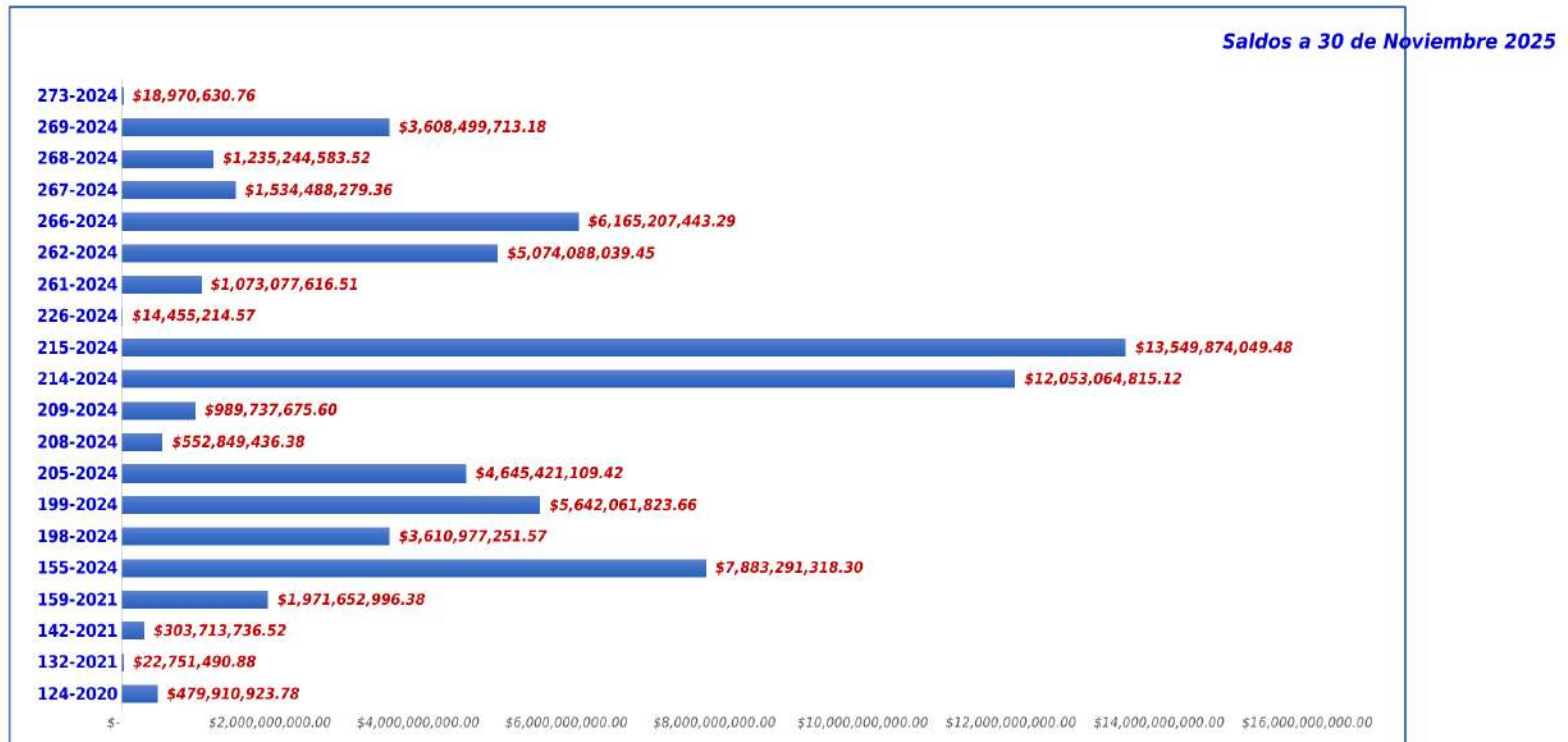

3.3 Saldos Fiducias por Contrato Vigencia 2025

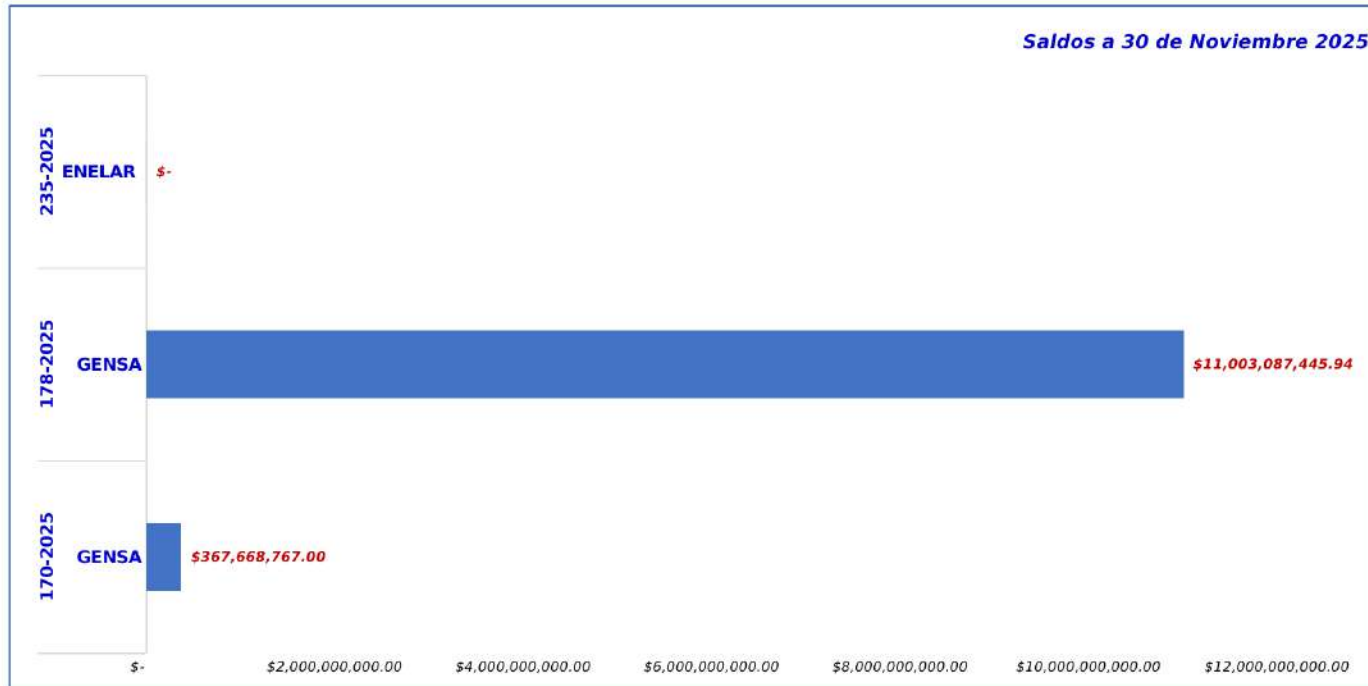



4. Proyección Pagos Vigencia 2025

4. Proyección Desembolsos Contratos 2025

PROYECCION PAGOS CONTRATOS 2025

No. IPSE	Departamento	Municipio	HITO DE PAGO CONTRACTUAL	dic-25	% Pago	Fecha Radicado	ID Control
170-2025	CAUCA	CALOTO	TERCER DESEMBOLSO	\$ 279.398.618,00	1%	2/12/2025	83183
170-2025	CAUCA	SILVIA	TERCER DESEMBOLSO	\$ 379.181.466,00	2%	2/12/2025	83186
170-2025	CAUCA	TORIBIO	TERCER DESEMBOLSO	\$ 991.089.211,00	4%	2/12/2025	83190
170-2025	CAUCA	TOTORO	TERCER DESEMBOLSO	\$ 504.468.640,00	2%	2/12/2025	83193
170-2025	CAUCA	CORINTO	TERCER DESEMBOLSO	\$ 1.936.167.203,00	8%	2/12/2025	83184
170-2025	CAUCA	J AMBALO	TERCER DESEMBOLSO	\$ 833.942.108,00	3%	2/12/2025	83185
Total Contrato				\$ 4.924.247.246,00	20%		
				\$ 24.621.236.225,00			

Este desembolso corresponde al 20% del total del contrato y los hitos de para el desembolso son:

- ✓ Ordenes de compra de materiales y equipos nacionales con factura cancelada y fecha de entrega
- ✓ Ordenes de compra de equipos importados con fecha de entrega
- ✓ Socialización preliminar de comunidad beneficiada del proyecto

NOTA: Se solicitó PAC a principios de Noviembre para cubrir este pago, esperamos aprobación de MHCP.

4. Proyección Desembolsos Contratos 2025

PROYECCION PAGOS CONTRATOS 2025

No. IPSE	Departamento	Municipio	HITO DE PAGO CONTRACTUAL	dic-25	% Pago	Fecha Radicado	ID Control
178-2025	GUANIA	PUERTO COLOMBIA (HIBRIDO)	SEGUNDO DESEMBOLSO	\$ 1.652.243.033,00	3,38%	5/12/2025	83200
178-2025	GUAVIARE	MIRAFLORES (MEJORAMIENTO)	SEGUNDO DESEMBOLSO	\$ 22.125.000,00	0,05%	5/12/2025	83199
178-2025	CASANARE	HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO (HIBRIDO)	SEGUNDO DESEMBOLSO	\$ 7.125.930.110,00	14,56%	5/12/2025	83211
178-2025	META	URIBE (MEJORAMIENTO)	SEGUNDO DESEMBOLSO	\$ 133.055.332,00	0,27%	5/12/2025	83182
178-2025	CHOCO	ATRATO Y CANTON DE SAN PABLO (HIBRIDO)	SEGUNDO DESEMBOLSO	\$ 894.209.615,00	1,83%	5/12/2025	83176
Total Contrato				\$ 9.827.563.090,00	20%		
				\$ 48.948.306.263,00			

Este desembolso corresponde al 25% del total de cada proyecto y los hitos de para el desembolso son:

- ✓ Contratos de obra e interventoría suscritos y legalizados
- ✓ Acta de inicio de obra e interventoría

NOTA: Se solicitó PAC a principios de Noviembre para cubrir este pago, esperamos aprobación de MHCP.

4. Proyección Desembolsos Contratos 2025

PROYECCION PAGOS CONTRATOS 2025

No. IPSE	Departamento	Municipio	HITO DE PAGO CONTRACTUAL	ene-26	% Pago	Fecha Radicado	ID Control
235-2025	VAUPES	PROYECTO MITU Y PACOA	PRIMER DESEMBOLSO	\$ 1.017.873.292,00	7,28%		
235-2025	CHOCO	PROYECTO ACANDI	PRIMER DESEMBOLSO	\$ 1.247.393.711,00	8,92%		
235-2025	CHOCO	PROYECTO MEDIO BAUDO-CHIGORODO	PRIMER DESEMBOLSO	\$ 1.164.242.304,00	8,33%		
235-2025	CHOCO	PROYECTO UNGUIA	PRIMER DESEMBOLSO	\$ 764.897.622,00	5,47%		
Total Contrato				\$ 4.194.406.929,00	30%		
				\$ 13.981.356.419,00			

Este desembolso corresponde al 30% del total del total del contrato y los hitos de para el desembolso son:

- ✓ Acta de inicio
- ✓ Contrato fiducia
- ✓ Plan de trabajo y cronograma
- ✓ Publicación de términos de referencia

NOTA: Se estima que el contratista podrá radicar la solicitud de primer desembolso en Enero de 2026.



5. Proyección Reservas Vigencia2025

PROYECCION RESERVAS GRUPO SEGUIMIENTO Y SUPERVISION

No. CONTRATO	ADMINISTRADOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR AUTORIZADO	PROYECCION RESERVA	ESTADO RESERVA
306-2023	SECOB	Interventoria Islas	\$ 2.163.178.501,12	\$ 1.946.860.651,01	\$ 216.317.850,11	
170-2025	GENSA	Gensa - Cauca	\$ 24.621.236.225,00	\$ 19.696.988.979,00	\$ 4.924.247.246,00	Solicitada a Financiera
178-2025	GENSA	Guainia/Choco/Meta/Guaviare/Casanare/Antioquia	\$ 48.948.306.263,00	\$ 20.781.939.534,00	\$ 28.166.366.729,00	Solicitada a Financiera
235-2025	ENELAR	Acandí-Unguía-Medio Baudó-Mitu y Pacoa	\$ 13.981.356.419,00	\$ -	\$ 13.981.356.419,00	
238-2025	ELECTROCAQUETA	Guacamayas	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	

\$ 89.864.077.408,12 \$ 42.425.789.164,01 \$ 47.438.288.244,11

6. Proyección proyectos vigencia 2026

MODALIDAD	ENTIDAD ESTRUCTURADORA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PDET	USUARIOS A BENEFICIAR	USUARIOS INDÍGENAS	VALOR REQUERIDO
CONCERTADO MPC	IPSE	CAUCA	PURACÉ	NO	316	316	\$ 10.827.128.595,22
CONCERTADO MPC	IPSE	CAUCA	INZA	NO	163	163	\$ 5.584.879.623,00
CONCERTADO MPC	IPSE	NARIÑO	GUACHUCAL	NO	20	20	\$ 685.261.303,50
CONCERTADO MPC	IPSE	NARIÑO	SANTA CRUZ	NO	23	23	\$ 788.050.499,02
CONCERTADO MPC	IPSE	NARIÑO	RICAUARTE	NO	42	42	\$ 1.439.048.737,34
CONCERTADO MPC	IPSE	NARIÑO	CORDOBA	NO	37	37	\$ 1.267.733.411,47
CONCERTADO MPC	IPSE	CAUCA	PÁEZ	NO	512	485	\$ 17.542.689.369,48
TOTAL					1113	1086	\$ 38.134.791.539,02
							\$ 38.134.791.540,00

11. RIESGOS IDENTIFICADOS

Se recomienda prestar especial importancia a los procesos conjuntos con la Subdirección de Planificación, particularmente sobre los proyectos objeto de estructuración y contratación sobre los cuales se han remitido algunas observaciones.

Se recomienda realizar mesas de trabajo conjuntas con la Subdirección de Planificación con el fin de unificar criterios e identificar riesgos en la fase de transición de los proyectos de estructuración / viabilización a la implementación de los mismos.

12. TEMAS CRÍTICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE

- Realizar el respectivo seguimiento y gestión de lo relativo a reservas presupuestales.
- Coordinación interinstitucional para con FENOGÉ por los procesos compartidos entre las dos entidades.
- Continuar con el seguimiento a proyectos para el archipiélago de San Bernardo, Bolívar. 2) rediseño de redes en proyecto de Cabo de la Vela y actualización de diseños de la granja solar en Cabo de Cabo de la Vela. 3) Rediseño de redes en el proyecto de Nazareth – Puerto Estrella.
- Seguimiento a las observaciones de la Subdirección de Contratos y Seguimiento relacionadas con los proyectos enviados en vigencias anteriores y que se encuentran en implementación.
- Realizar el oportuno seguimiento a la ejecución de los planes administrativos, proyecto de inversión, reporte de indicadores institucionales y sectoriales, y demás instrumentos de gestión y control que sean de competencia de la subdirección de Contratos y Seguimiento.

14. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

- Matriz de seguimiento de Contratos Grupo de Seguimiento y Supervisión
- Matriz de seguimiento de Contratos Grupo de Seguimiento a la prestación del servicio
- Rutas de almacenamiento: Se cuenta con cuentas institucionales para los diferentes niveles, así:

scys@ipse.gov.co
gsps@ipse.gov.co
gsys@ipse.gov.co



Lo correspondiente a claves de acceso puede gestionarse a través de los coordinadores por Grupo Interno o a través de TICs.

Atentamente,

Juan Pablo Alzate Soto
Subdirector saliente
